



УСТАНОВКА СПОРТИВНО - ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В СЕЛЕ ЖАЛҒЫЗТАЛ ГОРОДА АРКАЛЫК ДО КОНЦА 2021 ГОДА

Команда проекта:

Муханбетжанов Жандос Болтаевич аким села Жалғызтал города Аркалыка

Нұралы Сұңқар Бүркітбайұлы заведующий сектром ГУ
"Отдел финансов акимата города Аркалыка"

Сырғабай Махаббат Ботаевна руководитель отдела ГУ "Управление
информатизации, оказания государственных услуг и
архивов акимата Костанайской области

Дробышева Екатерина Владимировна заведующий сектром ГУ "Отдел
финансов акимата Сарыкольского района"

Инициатор: *Муханбетжанов Жандос Болтаевич*, ГУ "Аппарат акима
села Жалғызтал города Аркалыка", аким села



Миссия проекта




Здоровая нация - успешное будущее Казахстана

Касым-Жомарт Токаев

**государственная программа
“Программа развития регионов
на 2020-2025 годы”**



Жалгызтал

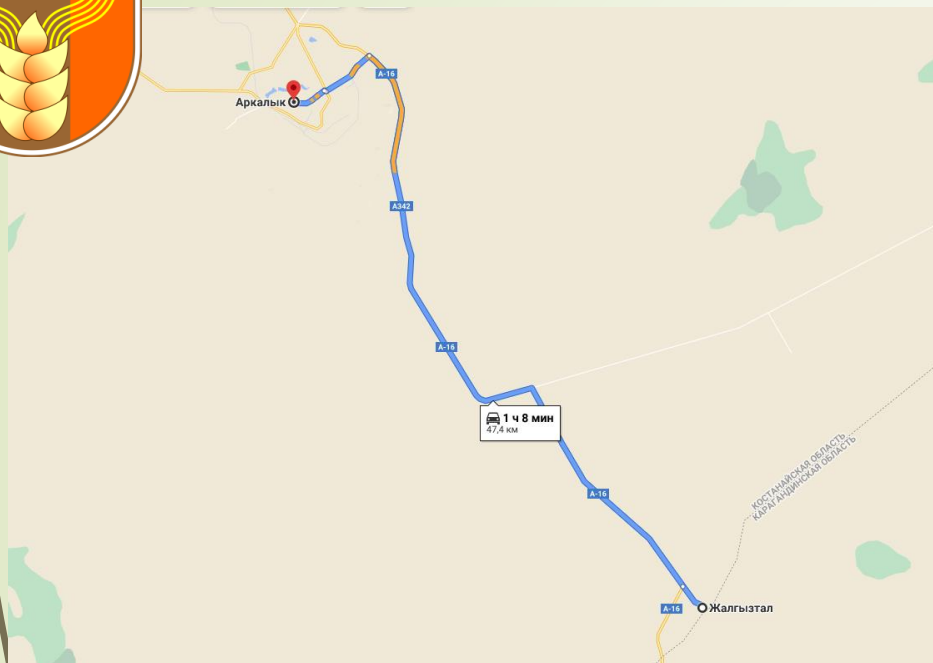

Село Жалгызтал находится под руководством города Аркалыка, расстояние от города менее 50 км. Численность населения на 1 января 2021 года согласно паспорта села:

305 человек из них

- Дошкольники – 14 чел
- Учащиеся – 50 чел
- Студенты – 10 чел
- Пенсионеры – 22 чел
- Инвалиды – 5 чел
- Трудоспособное население – 214

Миграция за 2020 год:

- Прибыло – 3 чел
- Убыло – 2 чел

Соц сфера:

- Школа
- мини - центр
- Библиотека
- Медицинский пункт

Бизнес сфера:

- ИП – 1 орг
- КХ – 16 орг
- ТОО – 3 орг



Актуальность проблемы, обоснование инициации



Пассивность



Малоподвижный образ



Набор массы тела



Дети в компьютере



Зависимость телефоном



Цель проекта

Установка спортивно-игровую площадку в с.Жалғызтал до конца 2021 года

В рамках государственной программы "Программа развития регионов на 2020-2025 годы" села Жалғызтал





Задачи проекта

Защита проекта, подача бюджетной заявки, проведение процедур гос.закупок, выделение финансирования.



Выбор места, размеры площадки, выбор покрытия для площадки, выбор спортивных сооружений.



Подготовка основания, установка детского игрового комплекса, установка уличных тренажеров, установка освещения, установка ограждения, декоративные работы.



Продукт проекта

Спортивно-игровая площадка



Сумма проекта 15,0 млн тенге:

- Футбольное поле
- Уличные тренажеры 12 штук
- Детский игровой комплекс
- Освещение
- Покрытия

Площадка общей площадью 1800м²



Местоположение площадки



Объект будет находится возле зданий
средний школы села Жалгызтал и
акимата села:

- имеется очень большая площадь
- Подконтролем , и наблюдением
акимата





Матрица анализа стейкхолдеров

Стейкхолдер	Роль в проекте	Ожидания и требования стейкхолдеров в отношении проекта	Ожидания проекта в отношении стейкхолдеров
ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка"	Инициатор, заказчик	Организовать досуг детей и взрослого населения, построить качественные тренажеры для занятия спортом, функциональные игровые комплексы. Организация культурно-массовых мероприятия во время праздничных дней. Проведение информационной работы среди населения по поводу правил безопасности и спокойствия граждан	Организация в реализации проекта, проведение процедур гос.закупок, работа с подрядчиком
Население села Жалгызтал	Бенифициары	Благоустройство села, улучшение условий отдыха ,укрепление здоровья посредством физических занятий. Организация соревнований. Развитие семейных ценностей и традиций	Активное участие.
Подрядчик	Поставщик, исполнитель	Заинтересованность в исполнении договорных обязательств	Качественное и своевременное выполнение работ, поставка оборудования, гарантия и обслуживание.

РЕЕСТР РИСКОВ

Описание риска	Вероятность наступления (1-4)	Последствия (1-4)	Итоговая оценка риска ВхП (1-16)	Владелец риска	Меры
Отсутствие разрешительной документации на строительство со стороны уполномоченных гос.органов	2	4	8	ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка"	Приведение документации в соответствие с требованиями уполномоченных гос.органов.
Не состоявшиеся гос. закупки .	1	1	1	ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка"	Повторное объявление .Информирование на портале гос.закупок
Изменение цен на работы и товары	1	1	1	ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка"	Предусмотреть возможность заключения доп.соглашения на дополнительное финансирование
Недобросовестные поставщики, не выполнение договорных обязательств подрядчиком	1	2	2	ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка"	Расторжение договора, поиски нового поставщика
Отсутствие финансирования	2	4	8	ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка"	Подавать дополнительную бюджетную заявку на выделение средств, поиск дополнительных средств
Поставка не качественного оборудования, а так же не соответствующего технической спецификации	1	2	2	ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка"	Детальное описание технической спецификации к договору
Срыв сроков реализации проекта в связи с погодными условиями	1	1	1	ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка"	Поиск объездных дорог, а так же составление графика выполнения работ с учетом природно-климатических условий



Границы и допущения проекта

Ограничения проекта

- по содержанию: 19 единиц
- по срокам: до 31 августа 2021 года
- по бюджету: 15 000 000 тенге, за счет трансфертов из областного бюджета

Допущения проекта:

- по содержанию: 19 единиц, детальное описание технической спецификации для случая предотвращения поставки некачественного и несоответствующего оборудования
- по срокам: до 30 сентября 2021 года
- по бюджету: 15 000 000 тенге, за счет трансфертов из областного бюджета, дополнительно увеличение бюджета за счет изменения цен, возможность заключения доп. соглашения



Ключевые даты проекта

Устав февраль 2021 года

Защита проектов февраль 2021 года

Подготовка документов для объявления конкурса – март 2021 года

Государственные закупки способом конкурса март-апрель 2021 года

Установка и работы по проекту май- август 2021 года

Принятие объекта в эксплуатацию август 2021 года



Результаты проекта

Я выбираю
СПОРТ





Смело, дружно с оптимизмом
За здоровый образ жизни!

Назарларыңызға
рақмет !!!

Спасибо за
внимание !!!

Thank you for
attention!!!
