



ПРЕЗИДЕНТ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫ

Абай ауданында «Саржал» қымыз өндіру цехын ашу

Дайындағандар:

Ерболова Айдана Асқарқызы

Тұраров Айбар

Амангелдінов Алмас Махсұтұлы

Айтов Аслан Нұрланұлы

Түсіпов Медғат Шалқарұлы

Өскемен қаласы 2021 жыл




БАСТАМАНЫҢ НЕГІЗДЕМЕСІ

Жобаны алудағы бірінші себеп: қымыз ол қазақтың ұлттық сусындарының бірі, бірақ қазыргы уақытқа дейін үлкен сұранысқа ие бола отырып, брендтік өнімге айналмай отыр. Екінші себеп, бүкіләлемдік індет кезінде қымыз арқылы Қазақстандықтар өз имунитеттерін нығайту үшін шипа ретінде қымыз өнімін тұтынды.

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының қымызының айрықша дәмі, біздің облысымыздың ішінде өте сұранысқа ие екені бәрімізге мәлім, соны ескере отырып басқа да облыстарға және нарыққа шығаруды көздеп отырмыз. Біздің жобамыз арқылы қымыз түрлерінің бес түрін сынап көруді ұсынамыз.

Оның ішінде:

- **БАЛ ҚЫМЫЗ**
- **ЖУАС ҚЫМЫЗ**
- **ҚҰНАН ҚЫМЫЗ**
- **ДӨНЕН ҚЫМЫЗ**
- **ТӨНЕМЕ ҚЫМЫЗ**

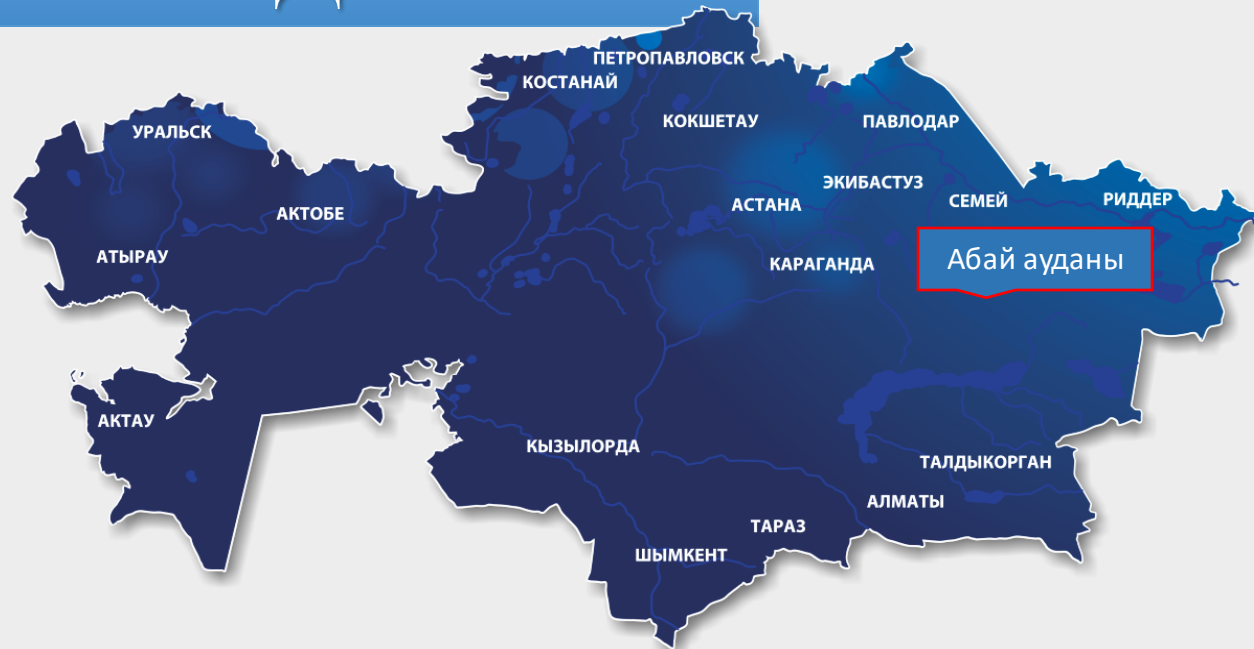



Жобаның жарғысы

Жобаның атауы	Абай ауданында «Саржал» қымыз өндіру цехын ашу
Бастамашы	ЖШС «Саржал» қымыз
Демеуші	«Кәсіпкерлік бөлімі»ММ, Даму копорациясы арқылы несие алу
Тапсырыс беруші	«Кәсіпкерлік бөлімі»ММ, Даму копорациясы, курылыс компаниялары, жоба командасы және жобалаушылар, жеткізушілер, мердігерлер, демеушілер, дүкендер, депутаттар және халық
Тапсырыс берушінің қажеттіліктері	Тапсырысты уақытында орындауын қамтамасыз ету.
Жобаның басшысы	Ерболова Айдана Асқарқызы, Тұраров Айбар, Амангелдінов Алмас Махсұтұлы, Айтов Аслан Нұрланұлы, Түсіпов Медғат Шалқарұлы
Бекітілген күні	21.01.2021 ж.
Дайындаған	Ерболова Айдана Асқарқызы, Тұраров Айбар, Амангелдінов Алмас Махсұтұлы, Айтов Аслан Нұрланұлы, Түсіпов Медғат Шалқарұлы



Жобаның миссиясы

Қазақстанда қымыз түрін түрлендіру, табиғи өнім ұсыну

Жобаның мақсаты

Абай ауданында 2021 жылдың маусымына дейін қымыздың 5 түрі бойынша тәулігіне 1 тонна қамыз өндіретін «Саржал» өндіру цехын ашу





СТЕЙКХОЛДЕРЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖОСПАРЫ

Стейкхолдер	Жобадағы рөлі	Ықпалы (бюджетке, нәтижеге, мерзімге) 1-4	Ықпал бағыт ы +/-	Қызығуш ылығы 1-4	Мүдделі тараптардың жобаға қатысты талаптары	Жобаның Мүдделі тараптардың талаптары	Байланыс / қатынасу стратегиясы	Мерзімділік
«Кәсіпкерлік бөлімі» ММ	Қолдаушы Кеңес беруші	3	+	3	Жобаның уақытылы және талаптарға критерийне сай жүзеге асырылуы	Жоспар бойынша қадағалауды ұйымдастыру	Жиналыс, құжат алмасу Белсенді қатысуы	Тұрақты
«Даму корпорациясы»	Демеуші	3	+	3	Қаражатты уақытылы әрі тұрақты қайтарылуы	Жобаның тиімділігін және жүзеге асу тұрақтылығы	Рәсімделген құжаттар, келімішарт, кездесулер, келіссөздер	Тұрақты
Жеке қожалықтар, қымыз сауатын	Өнімді қамтушылар	2	+	2	Жобадан тұрақты тапсырыс алуды	Сапалы әрі уақытылы, балғын өнім	Үнемі кездесулер, келіссөздер	Тұрақты
БАҚ	Бақылаушы және жарнамалаушы	2	+	4	Өндірістің көрсеткіштерін жақсарту	Жарнама және кіріс	Әрдайым жаңа өнім мен сыртқы әрлеуін жарнамалау	1-2-3 кезеңдерде
Дүкендер	Өнімді сатып алушы, таратушы	4	+	4	Өнімнің сапалы әрі тұрақты жеткізіліп отырылуы	Тұрақты тапсырыс берулерін	Ұзақ мерзімге келісім – шарт жасасу	Жобаның өнімі тестілеуден өткеннен кейін
Бөтелкені (тараны) алатын жер	Қамтамасыз етуші	4	+	3	Өнімінің сұранысқа ие болуы	Сапалы әрі таза тараларды ұсынуы	Ұзақ мерзімге келісім – шарт жасасу	3 кезеңде



Жоба міндеттері мен мерзімдері

Жарғыны әзірлеу және ЖСҚ дайындау 21.01 – 10.02 дейін 20 күн

Дайын өндіріс орнын табу және оны заңдастыру. 11.02 – 01.03 дейін 17 күн

Қаражат көзін уақытылы алу үдерісін ұйымдастыру 08.02 – 10.02 2 күн

Инфраструктура жүргізу, жобаның мақсатымен телевидения, басылымдар арқылы қоғамға жеткізу 11.02 – 05.03 21 күн

Жөндеу жұмыстарын жүргізетін мердігер компанияны тендер арқылы анықтау 11.02-20.02 9 күн

Жөндеу жұмыстарын жасау, аяқтау 01.03 - 15.04 45 күн

Керекті лабораториялық, өндірістік құрал жабдықтарға тапсырыс беру және жеткізу. 16.04 – 31.04 15 күн

Жұмысшылармен қамтамасыз ету, оқытып үйрету 17.04. – 01.05 14 күн

Өндіріс құралдарын орнату 01.05 – 04.05 3 күн

Шикізат өнімін қамтитын жеке меншік қожалықтармен шартқа отыру 10.05 – 16.05

Тараның сыртқы этикеткасының дизайнын ойластыру, бекіту, баспадан шығару. 16.05-20.05 4 күн

Маркетингтік бағытта видеороликтер түсіру 1,2,3 кезеңде

Лабораториялық жұмыстарды жасау қымыздың бес түріне байланысты тестілеу жұмыстарын жүргізу 16.05 – 18.05 2 күн

Дегустациялық шара ұйымдастыру, өнімдерге баға алу 15.06

Өндірісті іске қосу, өнімге тұсаукесер жасау 15.06





Жобаның қаражаты

35 000 000 млн. тг.

Қаржыландыру көздері:
*(жобада қаржыландырудың
бірнеше көзі қарастырылған)*

Бастаушы жеке кәсіпкерлерден, «Кәсіпкерлік бөлімі»ММ, Даму копорациясы арқылы несие алу, тапсырыс берушінің қаражаты

Шығындардың жұмсалуды:

Жобаны әзірлеудегі шығындар
Жұмысшылардың жалақысы
Мердігерлерге және т.б

Бие сауатын аппарат, қымыз пісетін және бөтелкелерге құюға арналған аппарат, трактор, бөтелкенің сыртын қаптайтын этикетка, жұмысшылар бригадасы



Жобаның өнімі



Сүт өндіру процесі

Дайын өнім

- Бал қымыз
- Дөнен қымыз
- Жуас қымыз
- Құнан қымыз
- Төнеме қымыз



Дүкен сөресіндегі өнім

Тасымалдау, жеткізу



Tenderbot

Тәуекелдер факторлары	Тәуекелдердің сипаттамасы	Салдары	Мүмкіндігі	Тәуекелдің қорытынды бағасы	Тәуекелді азайту бойынша шаралар	Тәуекел болған жағдайдағы стратегия	Тәуекелдің иесі
табиғи	Ауа-райының қолайсыздығынан өнімнің азайып кетуі.	1	2	3 төмен	Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты қажетті құрал-жабдықтармен қаматамсыз ету	Құрал-жабдықтарды сатып алу жөнінде алдын - ала шарт жасау	Жобаны ұйымдастырған топ
Адами	Мамандардың тапшылығы	2	2	5 орташа	Аудан әкімшілігі арқылы сұраныс жасау	Жобаның іске асырылмас бұрын аудан әкімінен қолдау алу	Жобаны ұйымдастырған топ
Экономикалық	Құрылыс материалдарының бағасының көтерілуі.	2	2	4 орташа	Құрылыс материалдарының бағасының өзгермеуі үшін алдын ала келісімшарт жасасып қою	Шартта көрсетілген жауапкершілік теріне байланысты әрекет ету	Жобаны ұйымдастырған топ
Өндірістік	Қымызға деген сұраныстың азаюы.	3	3	7 жоғары	Табиғи таза, сапалы өнімнің өндірілуіне бар жағдайды жасау	Жылдың 4 мезгілінде де пайдалану үшін сапалы әрі сұранысқа ие өнім өндіруге тырысу	Жобаны ұйымдастырған топ



Жауапкершілік матрицасы

	Жұмыс түрлері	Жоба рөлдері							
		Әкімшілік	Мердігер компания	Ауыл шаруашылық бөлімі	құрал-жа құрал-жабдықтарды өндіретін зауыттар	Тапсырыс беруші	Баспа ұйымы	видеороликтер түсіру орталығы	Жеке қожалықтар
1.	Дайын өндіріс орнын табу және оны заңдастыру	О	-	Ж	-	-	-	-	-
2.	Жөндеу жұмыстарын жасау, аяқтау	-	О/Ж	-	-	Қ	-	-	-
3.	Керекті лабораториялық, өндірістік құрал жабдықтарға тапсырыс беру және жеткізу.	-	-	-	О/Ж	Қ	-	-	К
4.	Жұмысшылармен қамтамасыз ету, оқытып үйрету	К	-	О	-	Ж	-	-	-
5.	Өндіріс құралдарын орнату	-	О	-	О/Ж	Қ	-	-	-
6.	Тараның сыртқы этикеткасының дизайнын ойластыру, бекіту, баспадан шығару.	-	-	К	-	Қ	О	-	-
7.	Маркетингтік бағытта видеороликтер түсіру	-	-	-	-	Қ	-	О	-
8.	Өндірісті іске қосу, өнімге тұсаукесер жасау	Қ	-	Қ	-	О	-	-	-

Ж- жауаптылар

К – кеңес беруші

О – орындаушы/ қосымша көмекші

Қ - қадағалаушы



**ЖОБА МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
ҚОЛДАУЫМЕН ӘЗІРЛЕНДІ**
