

Шұжық цехын қайта жаңғырту

ТОП ҚҰРАМЫ

(аты-жөні, жұмыс орны,
қолтаңба)

1. Құдайбергенова Лаура Қазбаевна – Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы, бас маман.
2. Буленов Ардақ Нұрахметович – Қызылөзек ауылдық округі, бас маман.
3. Мәлік Эльмира Мәлікқызы – Қызылорда облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының бас маманы
4. Корпелдесова Рая Жетписбаевна – Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы, бас маман.

КЕЛІСІЛДІ:

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН
ІСКЕ АСЫРУ ЖӘНЕ ІЛГЕРІЛЕТУ
КАБИНЕТІ

ҚЫЗЫЛОРДА

К. Джрауова

«__» _____ 2021 ж.

Жоба жарғысы

| | |
|---------------------------|---|
| Жоба атауы | Шұжық цехын қайта жаңғырту |
| Бастамашы | Жеке кәсіпкер, Буленов Ардақ Нұрахметович |
| Демеуші | Қызылорда қаласы әкімдігі. Қаржы компаниялары, кәсіпкерлер, 2 деңгейлі банктер |
| Жоба жетекшісі | Корпелдесова Рая Жетписбаевна– Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы, бас маман. |
| Бекітілген мерзімі | 07.06.2021 – 01.03.2022 ж |
| Дайындаған | Құдайбергенова Лаура Қазбаевна – Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы, бас маман. Буленов Ардақ Нұрахметович– Қызылөзек ауылдық округінің бас маманы. Мәлік Эльмира Мәлікқызы– Қызылорда облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының бас маманы Корпелдесова Рая Жетписбаевна – Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы, бас маман. |
| Жоба миссиясы | Кәсіпкерлікті дамыту, ауыл тұрғындарын жұмыссыздықтан арылту, қала және облыс тұрғындарын биологиялық таза шұжық өнімдерімен қамтамасыз ету, цехқа қажетті мал бордақылау алаңын салу арқылы шикізат мәселесін шешу. |

| | |
|--|---|
| Бастаманы негіздеу | 5 қазан 2018 жылғы Н. Назарбаевтың "Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру" Қазақстан халқына Жолдауы, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы және Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы, Жұмыспен қамтудың жол картасы |
| Жоба мақсаттары | 2022 жылдың 1 наурызына дейін Қараөзек кооперативіндегі шұжық цехын қайта іске қосу және мал бордақылау алаңын салу. Мал шаруашылығын дамыту. Шаруа қожалықтарымен (аталған ауылдық округте 34 шаруа қожалықтары бар) меморандумға отыра отырып, екі жақты келісім арқылы шұжық өнімдерін (әзірге 4 түрі – жартылай ысталған, пісірілген, сервелат, сосиска) шығаруды жүзеге асыру |
| Жоба міндеттері | -Шұжық цехын қайта қалпына келтіру және мал бордақылау алаңын іске қосу арқылы ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыру. -Жаңа жұмыс орындарын құру (15 адам) -Кәсіпкерлікті дамыту |
| Жобаның жетістігін бағалаудың көрсеткіштері | <ul style="list-style-type: none"> •Кәсіпкерлерге қолдау көрсету және олардың дамуына жағдай жасау •Ауылдағы жұмыссыздық деңгейін азайту •Жабылып қалған цехты қайта жаңғырту •Жаңадан мал бордақылау алаңын сала отырып, жеке кәсіпкерлер арқылы шикізат мәселесін шешу. •Жаңа белеске әкелетін жоба •Балғын өнімді ұсыну |
| Жоба өнімі | Биологиялық таза шұжық өнімдерін өндіру. |
| Жобаға тапсырыс беруші | “Қараөзек” ауылшаруашылығы өндірістік кооперативі |

| | |
|--|--|
| Тапсырыс берушінің қажеттіліктері | <p>“Қараөзек” ауылшаруашылығы өндірістік кооперативіндегі 1994 жылы ашылған шұжық цехының жабылып қалғандығына байланысты, ішіндегі құрал-жабдықтар тозып кетпеуі үшін, қолда бар ресурстарды пайдалана отырып қайта іске қосу және осы цехқа қажетті мал бордақылау алаңын салу, шаруа қожалықтарымен келісім-шартқа отыру арқылы шикізат мәселесін шешу.</p> |
| Жобаның мүдделі тараптары | <p>Қараөзек кооперативі мен шаруа қожалықтары, кәсіпкерлер, ауыл тұрғындары (жұмыспен қамту бағытында), өнімді тұтынушылар</p> |
| Жобаны жіберу: Мерзімі бойынша; | <p>07.06.2021 – 01.03.2022 ж</p> |
| Құны бойынша; Ресурстар бойынша) | <p>Құны 35 млн теңге. (3 млн -күрделі жөндеу, алаң салу, -5 млн, сатып алу бастапқы уақытта -15 млн, цехты күтіп ұстау- 12 млн (айлық, салық, өрт қауіпсіздігі, санитарлық талаптар, коммуналдық төлемдер т.с.с)</p> <p>Ресурстар: 15 штат бірлігі (1 штат директор(техника және өрт қауіпсіздігіне жауапты маман) -200000 тг, 1 штат ветеринар-120000 тг, 1 штат бухгалтер-120000 тг, 3 штат қасапшы -300000 тг, 3 штат жүк тасушы-200000 тг, 1 штат технолог-150000 тг, қарауыл -2 штат-120000 тг, жүргізуші -1 штат-80000 тг, еден жуушы -2-150000 тг)</p> |

| | |
|---|--|
| Жобаны шектеу | Қызылөзек ауылдық округі шаруашылықтарының және мүдделі тараптардың қаржысының жетіспеушілігі |
| Жобаның басымдықтары | Агроөнеркәсіп саласын дамыту және халқымызға қажетті халал өнімдерін тұтынуға ұсыну және кәсіпкерлерге арналған мал бордақылау алаңын салу және кәсіпкерлермен меморандумға қол қою арқылы алыстан шикізаттарды іздеп жүру проблемасын жою. |
| Соңғы мерзім | наурыз 2022 жыл |
| Жобаның басты күндері (кезеңдер) | <p>Жобаны бастау: маусым 2021 жыл, іске асырылуы – наурыз 2022 жыл.</p> <p>6 кезең мысалы: 1) жоба сметалық құжат жасау, ауылдық округтегі жер телімін рәсімдеу жұмыстары- 2 ай</p> <p>2) Кәсіпкерлермен келісім шартқа отыру – 1 ай</p> <p>3) Қаржы мекемелеріне бизнес жобаны ұсыну арқылы кредит алу -2 ай</p> <p>4) Цехты күрделі жөндеуден өткізу – 2 ай</p> <p>5) Құрылыс жұмыстары – 3 ай</p> <p>6) Наурыз айында жобаны аяқтап, цехты жұмысқа қосу</p> |

Күнтізбелік жұмыс кестесі

(Жобаның барлық бақылау нүктелерін және басталу мен аяқталу белгіленген күндерімен жұмысты сипаттайтын жоспар-кестесі)

| | Жұмыс атауы | 2021-2022 жыл | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|--------------|------------------|-------|--------|
| | | Маусым-шілде | Тамыз-қыркүйек | Қазан-қараша | Желтоқсан-қаңтар | Ақпан | Наурыз |
| 1 | Жобаның іске асуына қажетті жабдықтарды әзірледі ұйымдастыру (кәсіпкерлермен меморандумға отыру, жоба сметалық құжаттар, жер телімін рәсімдеу) | * | | | | | |
| 2 | Каз Агро Қаржы, Бизнес Бастау жобаларына бизнес жобаны ұсыну | | * | | | | |
| 3 | Шұжық цехына күрделі жөндеуден өткізу | | | * | | | |
| 4 | Құрылыс компанияларымен келісім-шартқа отырып, мал бордақылау алаңын салу | | | * | * | | |
| 5 | Малды бордақылау, жарнама қызметтері | | | | | * | * |
| 6 | Жұмысқа қызметшілер алу | | | | | | * |
| 7 | Өнімді өткізу үшін кәсіпкерлермен келісім-шартқа отыру | | | | | * | * |
| 8 | Жобаны аяқтау | | | | | | * |

Жауапкершілік матрицасы
(Жауапкершілік матрицасы негізгі жұмыстарды орындауға қатысты жоба рөлдерінің жауапкершілігін белгілейді)

| № | Жұмыс түрлері | Жобалық рөлдер | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | Буленов Ардак | Корпелдесова Рая Жетписбаевна | Кудайбергенова Лаура казбаевна | Мәлік Эльмира Мәлікқызы | Жеке кәсіпкер, қаржы компаниялары |
| 1 | Жобаның іске асуына қажетті жабдықтарды әзірлеуді ұйымдастыру (кәсіпкерлермен меморандумға отыру, | Ж | К | Қ | О | |
| 2 | Каз Агро Финанс, Бизнес Бастау жобаларына бизнес жобаны ұсыну | К | Ж | Қ | О | |
| 3 | Шұжық цехына күрделі жөндеуден өткізу | К | Қ | О | Ж | |
| 4 | Құрылыс компанияларымен келісім-шартқа отырып, мал бордақылау алаңын салу | О | К | Қ | Ж | |
| 5 | Малды бордақылау | Ж | К | Қ | О | |
| 6 | Жұмысқа қызметшілер алу | К | Қ | О | Ж | |
| 7 | Өнімді өткізу үшін кәсіпкерлермен келісім-шартқа отыру | О | К | Қ | Ж | |
| 8 | Жобаны аяқтау | К | Ж | Қ | К | О |

Стейкхолдерлерді талдау матрицасы

| Стейкхолдер | Жобадағы рөлі | Бюджет, нәтижелер, мерзімдер және т.б.) | Әсер ету деңгейі 1-4 | Қызығушылық 1-4 | Мүдделі тараптардың үміттері және жобаға қызығу тараптар тараптар тараптар жобаның | Мүдделі тараптардың үміттері | Түсіндіру | Байланыс / өзара әрекеттесу | Суреттегілік |
|---|----------------|---|----------------------|-----------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------|
| “Қараөзек” ауылшаруашылығы өндірістік кооперативі | Жоба жетекшісі | 4 | + | 4 | Өнімдерді өндіру және қажетті мал бордақылау алаңын салу | Цехтың жұмыс жасауы | Тиімді кеңес беру, түсіндіру шаралары, насихаттау, жарнамалар, пайда табу. | Әлеуметтік желілерде мақала жариялау, кәсіпкерлерді, ауыл тұрғындарын қатыстыру, жобаның тиімділігін түсіндіру | Жылына 1 рет |
| Жеке кәсіпкерлер | орындаушы | 4 | + | 4 | Өздерінің малдарын өткізетін жерді іздеп жүру проблемасын жою | Тиімді бағада өткізу | Пайда табу | жобаның тиімділігін пайдалану | 07.06.2021-03.2022 |
| Ауыл тұрғындары | тұтынушы | 2 | + | 4 | Халал өнімдерді пайдалану және жұмыссыздықты азайту | Биологиялық таза өнімді тұтыну | Жұмыссыздар қатарын азайту | жобаның тиімділігін пайдалану | 2 |

Тәуекелдер реестрі

(Жобаның сәйкестендірілген тәуекелдері жобада туындауы мүмкін және жағымсыз әсерлерге әкеп соқтыратын салдарларды тудыруы мүмкін белгісіз оқиғаларды қамтиды)

| Тәуекелдер факторы | Тәуекелдер сипаттамасы | Салдары | Ықтималдық | Тәуекелдерді қорытынды бағалау | Тәуекелдерді басқару стратегиясы | Тәуекелдердің орындалу жағдайындағы стратегиясы | Тәуекелдер иесі |
|-------------------------|---|------------------|------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Жобаның қолдау таппауы, | Мүдделі тараптардың өздерінің қызығушылық танытпауы | Жоба іске аспауы | 20% | 2 | Стейкхолдерлер мен түсіндіру жұмыстарын жүргізу, жаңа әдісті кеңінен насихаттау | Жоба орындалуын алға жылжыту, жаңа ұсыныстар, жаңа идеялар | Қараөзек өндірістік кооперативі |
| Техникалық тәуекелдер, | Істен шықпауын қарап отыру, күтім жасау | | 30 | 2 | Техника мамандары | Технолог мамандары | |
| Бағаның тұрақсыздығы | Нарықтағы баға | | 40 | 32 | Қарап отыру | реттеу | |

Жоба аясында байланыстар
(Коммуникацияларды басқару жоспары жобаға қатысушылар
тарапынан коммуникацияларға қойылатын талаптарды көрсетеді)

| Ақпарат жіберуші | Қажетті ақпараттар | Ақпарат қабылдаушы | Ақпарат жіберу тәсілі | Ескерту |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--|---|
| Қараөзек өндірістік кооперативі . | Атқарылған жұмыстар бойынша қажетті ақпарат беріп отыру | Жеке кәсіпкерлер | БАҚ, әлеуметтік желілер, брифингтер арқылы насихаттау. | Жобаның жүзеге асыру барысы жөнінде ай сайын, апта сайын ақпарат жіберіп отыру. |



Шұжық цехын қайта жаңғырту



Шұжық цехын қайта жаңғырту, мал бордақылау алаңын салу.

Орны – Қызылорда қаласы,
Қызылөзек ауылдық округі

Қуаты – 1 тонна 2 сменде
немесе 500 кг 1 сменде

Өнімнің орташа құны, 1 кг
мүйізді ірі қарамен
есептегенде -1650 т

Жұмыс орнына тартылған
адам – бастапқыда 15
қызметкер.

Жобаның құны 35 000 000
теңге (екі сменде 1000 т кг
шұжықты өндіргенде 1
млн теңге, шамамен 3-5
жыл аралығында жоба
құнын өтеуге болады)

Бәсекелес өндірістер – Қызылорда
қаласы бойынша 2 шұжық цехы

Шикізат бағасы
қонымды, балғын,
отандық өнім.

Жобаның артықшылығы – Жоғары рентабельділік және жұмыстың бірінші кезеңінде барлық инвестицияларды өтеу, Қазақстандағы ашылып жабылып қалған зауыттарды реконструкция жасау арқылы шығынға батудан сақтау және кез-келген үкіметтен бөлінген тиынды үнемді, өнімді пайдалану. Кәсіпкерлер, малды бордақылап, шикізат мәселесі шешімін табады деп жоспарлануда.

Өткізу нарығы – өндірілген өнімді сату, Қызылорда қаласы және облыстағы сауда нүктелері арқылы жүзеге асады.


Малдың ішек-қарны мен тұяқтарын базар бағасынан сәл түсіре отырып сату және қалдықтарды да іске асыру.

Халал өнім –шұжық цехын қайта жаңғыртудың және цехқа, кәсіпкерлерге қажетті мал бордақылау алаңын салудың артықшылықтары қандай?


Қызылөзек ауылдық округінде орналасқан шұжық цехының ашылуына 1994 жылы Елбасымыз өзі қатысқан болатын. Жаңа құрылғылар бар, қазіргі таңда жабылып қалғанымен, ол цехты қайта жаңғырту арқылы облыс көлемінде таза халал өнімдерді өндіру арқылы кәсіпкерлікті дамытумен қатар, ашылған өндіріс орындарының талан таражға түспей, халық игілігіне жұмсалса және сонымен қатар қаладан қашықтығы 37 км орналасқан, темір жол түйығы бар, ауылда мал бордақылау алаңын салу арқылы малдарды семірте отырып, шикізат тапшылығын болдырмау.



Цехтағы киім ілу шкафы мен дайын өнімдер цехы.

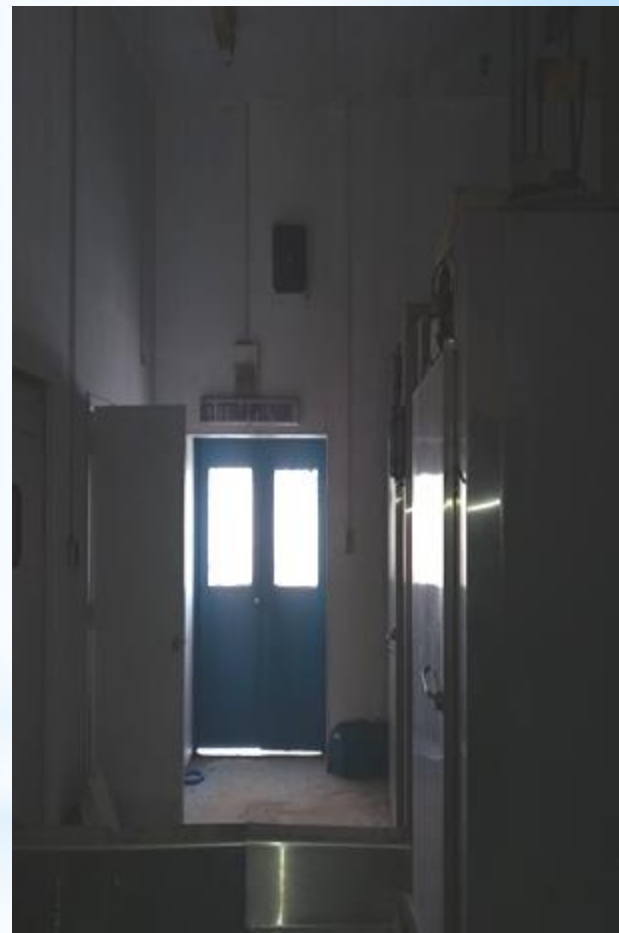


| Категория | 1 кг тірі салмақтың бағасы, тг | Орташа тірі салмағы (1-бас), кг | 1 кг бағасы | 1 ұлпаның орташа салмағы, кг |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| Сиыр | 595 | 420 | 1650 | 230 |
| 1 жастан асқан қашар | 655 | 550 | | |
| 1 жасқа дейінгі қашарлар | 655 | 160 | | |
| Тұқымдық бұқалар | 1200 | 700 | | |
| 1 жастан асқан бұқалар | 625 | 330 | 1650 | 180 |
| 1 жасқа дейінгі бұқашықтар | 625 | 180 | 0 | 0 |

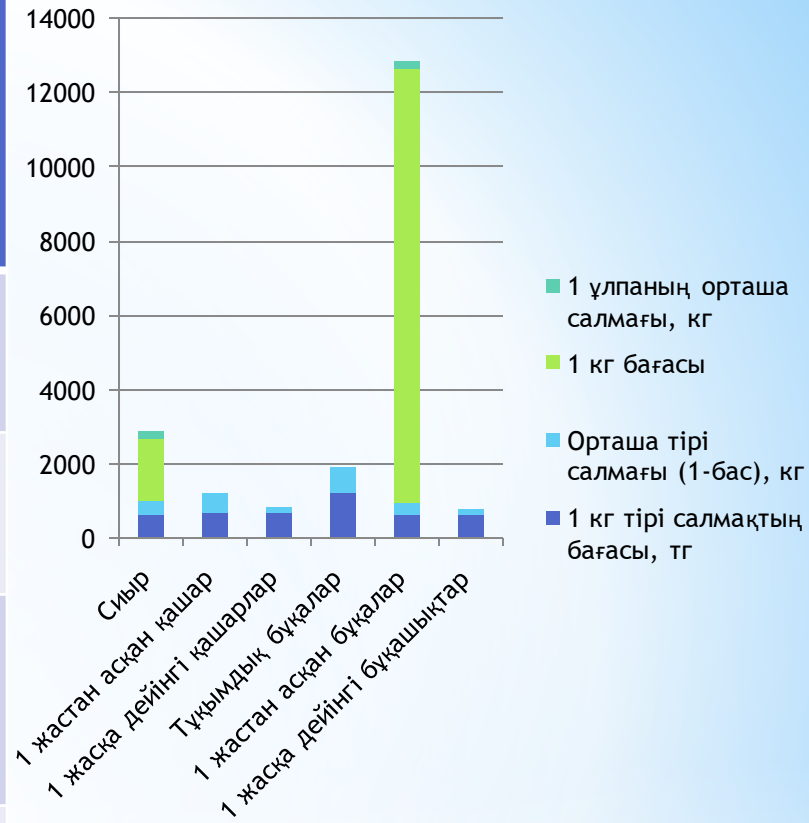

3000 бас мал бордақылау алаңы, кәсіпкерлермен меморандумға отыру арқасында шұжық цехының шикізаты осы мал бордақылау алаңында дайындалады. Болашақта ауылдық округтен жер (500-700 га көлемінде) алып, жүгері, жоңышқа, бидай егіп мал азығына дайындалатын болады. Аталған жоба бойынша материалдық техникалық жабдықтар бар, мұздатқыш, ет өңдеу кіші зауыты, шұжық, қалбырдағы ет шығаратын жабдықтар бар.

* Техникалық шарт

| | Шикізат мөлшері, кг | Тұз 3 %, кг | Натрий нитраты, мг | Қоспала р, 1 кг, 10-12 гр | Қаптағы ш, 60 д, м | Сиыр еті, кг | Құс еті майы, кг | Крахмал, кг |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| Жартылай ысталған шұжық | 100 | 3 | 8 | 1,2 | 50 | 67 | 25 | 1,8 |
| Пісірілген шұжық | 100 | 2,6 | 4 | 12 | 50 | 8 | 25,4 | 2 |
| Сервелат | 100 | 2,5 | 4,7 | 11,8 | 45 | 7,6 | 26 | 2 |
| Сосискалар | 100 | 2,1 | 5 | 15 | 40 | 7,8 | 23,8 | 2 |

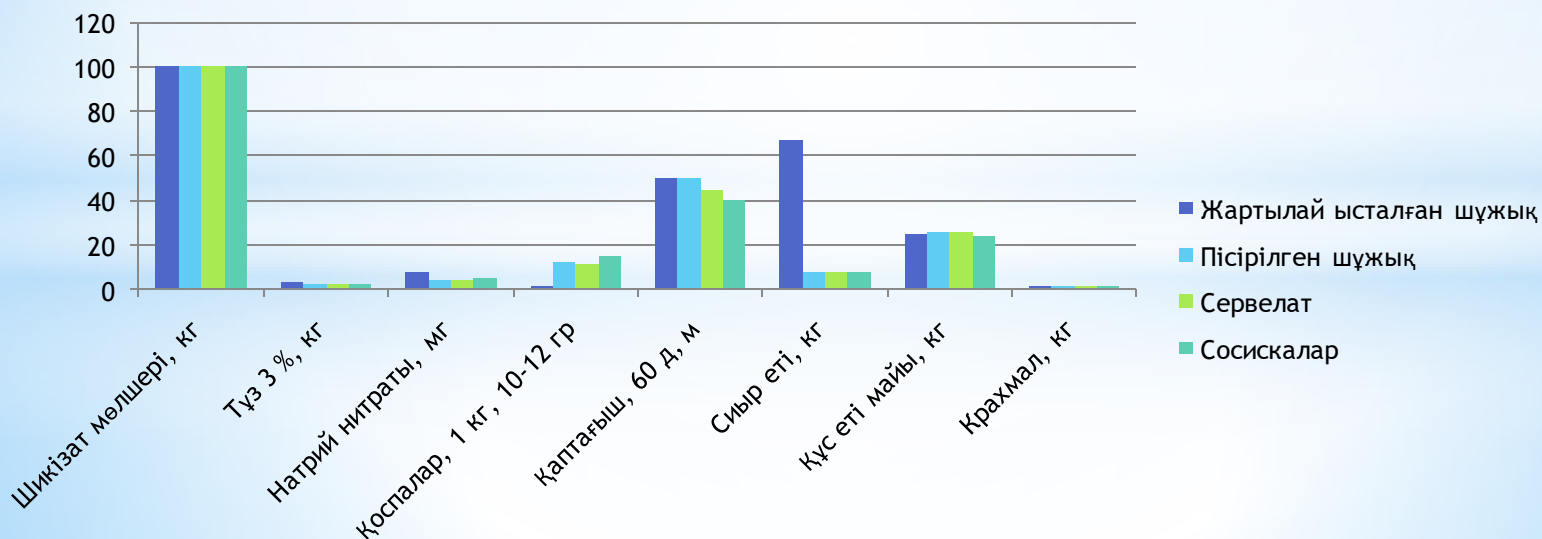

* Жартылай ысталған шұжық алу ТЕХНОЛОГИЯСЫ



Цехтың жай-күйі. (сыртқы және ішкі көріністері)



* Цех жұмыс жасап тұрғанда өндірілген өнімдер



* Малдарды уақытша ұстау алаңы мен шұжық цехының сыртқы көрінісі





Шұжық цехының тиімділігін, рентабельділігін арттыру үшін етті ғана шұжық шығаруға қолданып қоймай, қалдықсыз технологияны қолдана отырып, бас, тұяқ, ішек-қарын және қалған сүйектерді, қалдықтарды іске асыру ең басты міндеттің бірі. Жалпы сиыр еті өзінің құндылығы бойынша жылқы етіне қарағанда арзан шикізат болып табылады.

Шұжық цехы қала орталығына жақын орналасқан, теміржол тұйығы бар, скважинасы бар.



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
